CITTA' DI FRATTAMAGGIORE
(Provincia di Napoli)

RIQUALIFICAZIONE AREA PIP

REALIZZAZIONE ATTREZZATURE COLLETTIVE URBANE

PROGETTO ESECUTIVO

Titolo dell'elaborato:

CRONOPROGRAMMA DELL'INTERVENTO

Tavola n.	IL RUP	IL SINDACO	IL PROGETTISTA
G9	ARCH. STEFANO PRISCO	DOTT. FRANCESCO RUSSO	ING. GIOVANNI CRISTIANO
RAPP.			
Data GENNAIO 2014			
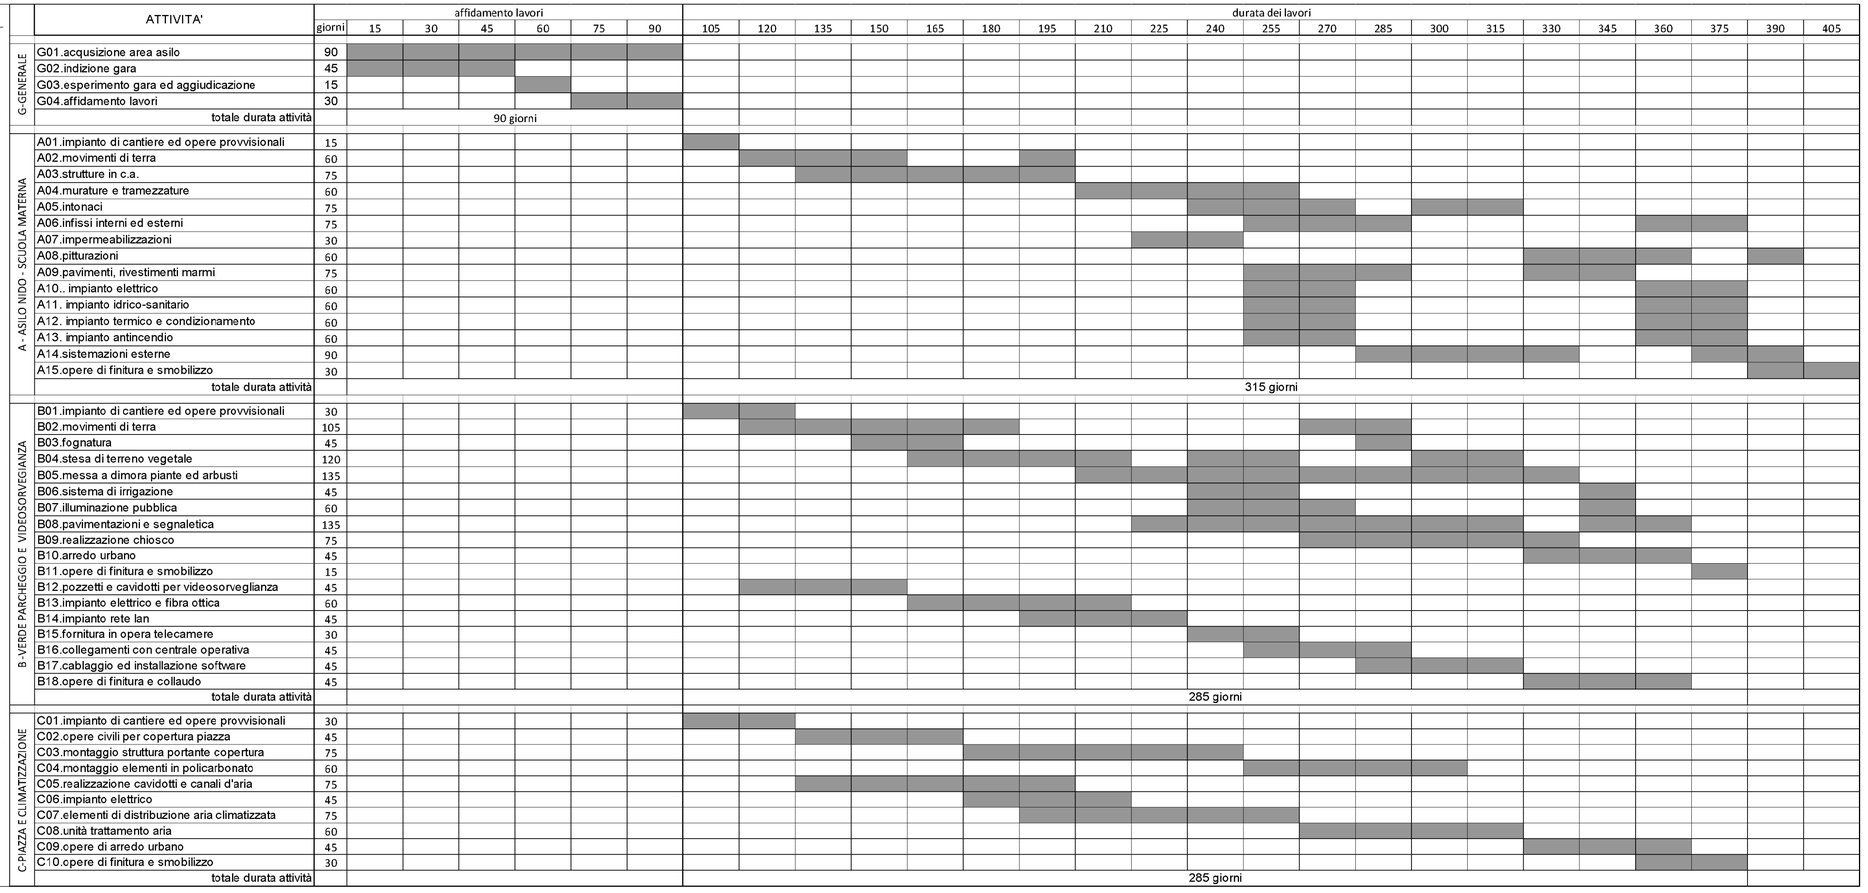
	ATTIVITA'	giorni	affidamento lavori	durata dei lavori
G-GENERALE	G01.acqusizione area asilo	90		
	G02.indizione gara	45		
	G03.esperimento gara ed aggiudicazione	15		
	G04.affidamento lavori	30		
	totale durata attività		90 giorni	
A - ASILO NIDO - SCUOLA MATERNA	A01.impianto di cantiere ed opere provvisionali	15		
	A02.movimenti di terra	60		
	A03.strutture in c.a.	75		
	A04.murature e tramezzature	60		
	A05.intonaci	75		
	A06.infissi interni ed esterni	75		
	A07.impermeabilizzazioni	30		
	A08.pitturazioni	60		
	A09.pavimenti, rivestimenti marmi	75		
	A10.. impianto elettrico	60		
	A11. impianto idrico-sanitario	60		
	A12. impianto termico e condizionamento	60		
	A13. impianto antincendio	60		
	A14.sistemazioni esterne	90		
	A15.opere di finitura e smobilizzo	30		
	totale durata attività			315 giorni
B-VERDE PARCHEGGIO E VIDEOSORVEGIANZA	B01.impianto di cantiere ed opere provvisionali	30		
	B02.movimenti di terra	105		
	B03.fognatura	45		
	B04.stesa di terreno vegetale	120		
	B05.messa a dimora piante ed arbusti	135		
	B06.sistema di irrigazione	45		
	B07.illuminazione pubblica	60		
	B08.pavimentazioni e segnaletica	135		
	B09.realizzazione chiosco	75		
	B10.arredo urbano	45		
	B11.opere di finitura e smobilizzo	15		
	B12.pozzetti e cavidotti per videosorveglianza	45		
	B13.impianto elettrico e fibra ottica	60		
	B14.impianto rete lan	45		
	B15.fornitura in opera telecamere	30		
	B16.collegamenti con centrale operativa	45		
	B17.cablaggio ed installazione software	45		
	B18.opere di finitura e collaudo	45		
	totale durata attività			285 giorni
C-PIAZZA E CLIMATIZZAZIONE	C01.impianto di cantiere ed opere provvisionali	30		
	C02.opere civili per copertura piazza	45		
	C03.montaggio struttura portante copertura	75		
	C04.montaggio elementi in policarbonato	60		
	C05.realizzazione cavidotti e canali d'aria	75		
	C06.impianto elettrico	45		
	C07.elementi di distribuzione aria climatizzata	75		
	C08.unità trattamento aria	60		
	C09.opere di arredo urbano	45		
	C10.opere di finitura e smobilizzo	30		
	totale durata attività			285 giorni
